

横須賀ごみ処理施設の整備状況について

「横須賀ごみ処理施設」の整備状況を報告いたします。

1 建設計画地の用地買収

平成 26 年 5 月 29 日 仮契約書締結
平成 26 年 6 月 27 日 議決 ⇒ 本契約

2 環境影響予測評価手続き・都市計画決定手続き

平成 26 年 7 月 18 日 公告・告示

3 新設道路及び造成工事（平成 26 年 7 月 1 日 ～ 平成 28 年 6 月 30 日）

平成 26 年 9 月 22 日 着工
請負業者
花和・オガワ・栃木特定建設工事共同企業体
代表者 株式会社 花和産業

4 発生土埋立付帯工事（平成 26 年 8 月 8 日 ～ 平成 27 年 3 月 13 日）


平成 26 年 9 月 22 日 着工
請負業者
株式会社 いづみ工事

5 トンネル新設工事（平成 26 年 12 月 15 日 ～ 平成 28 年 5 月 31 日）


平成 27 年 2 月上旬 着工予定
請負業者
西武建設・田中石材土木工事共同企業体
代表者 西武建設 株式会社

6 横須賀ごみ処理施設建設工事

平成 27 年 1 月 29 日 入札予定

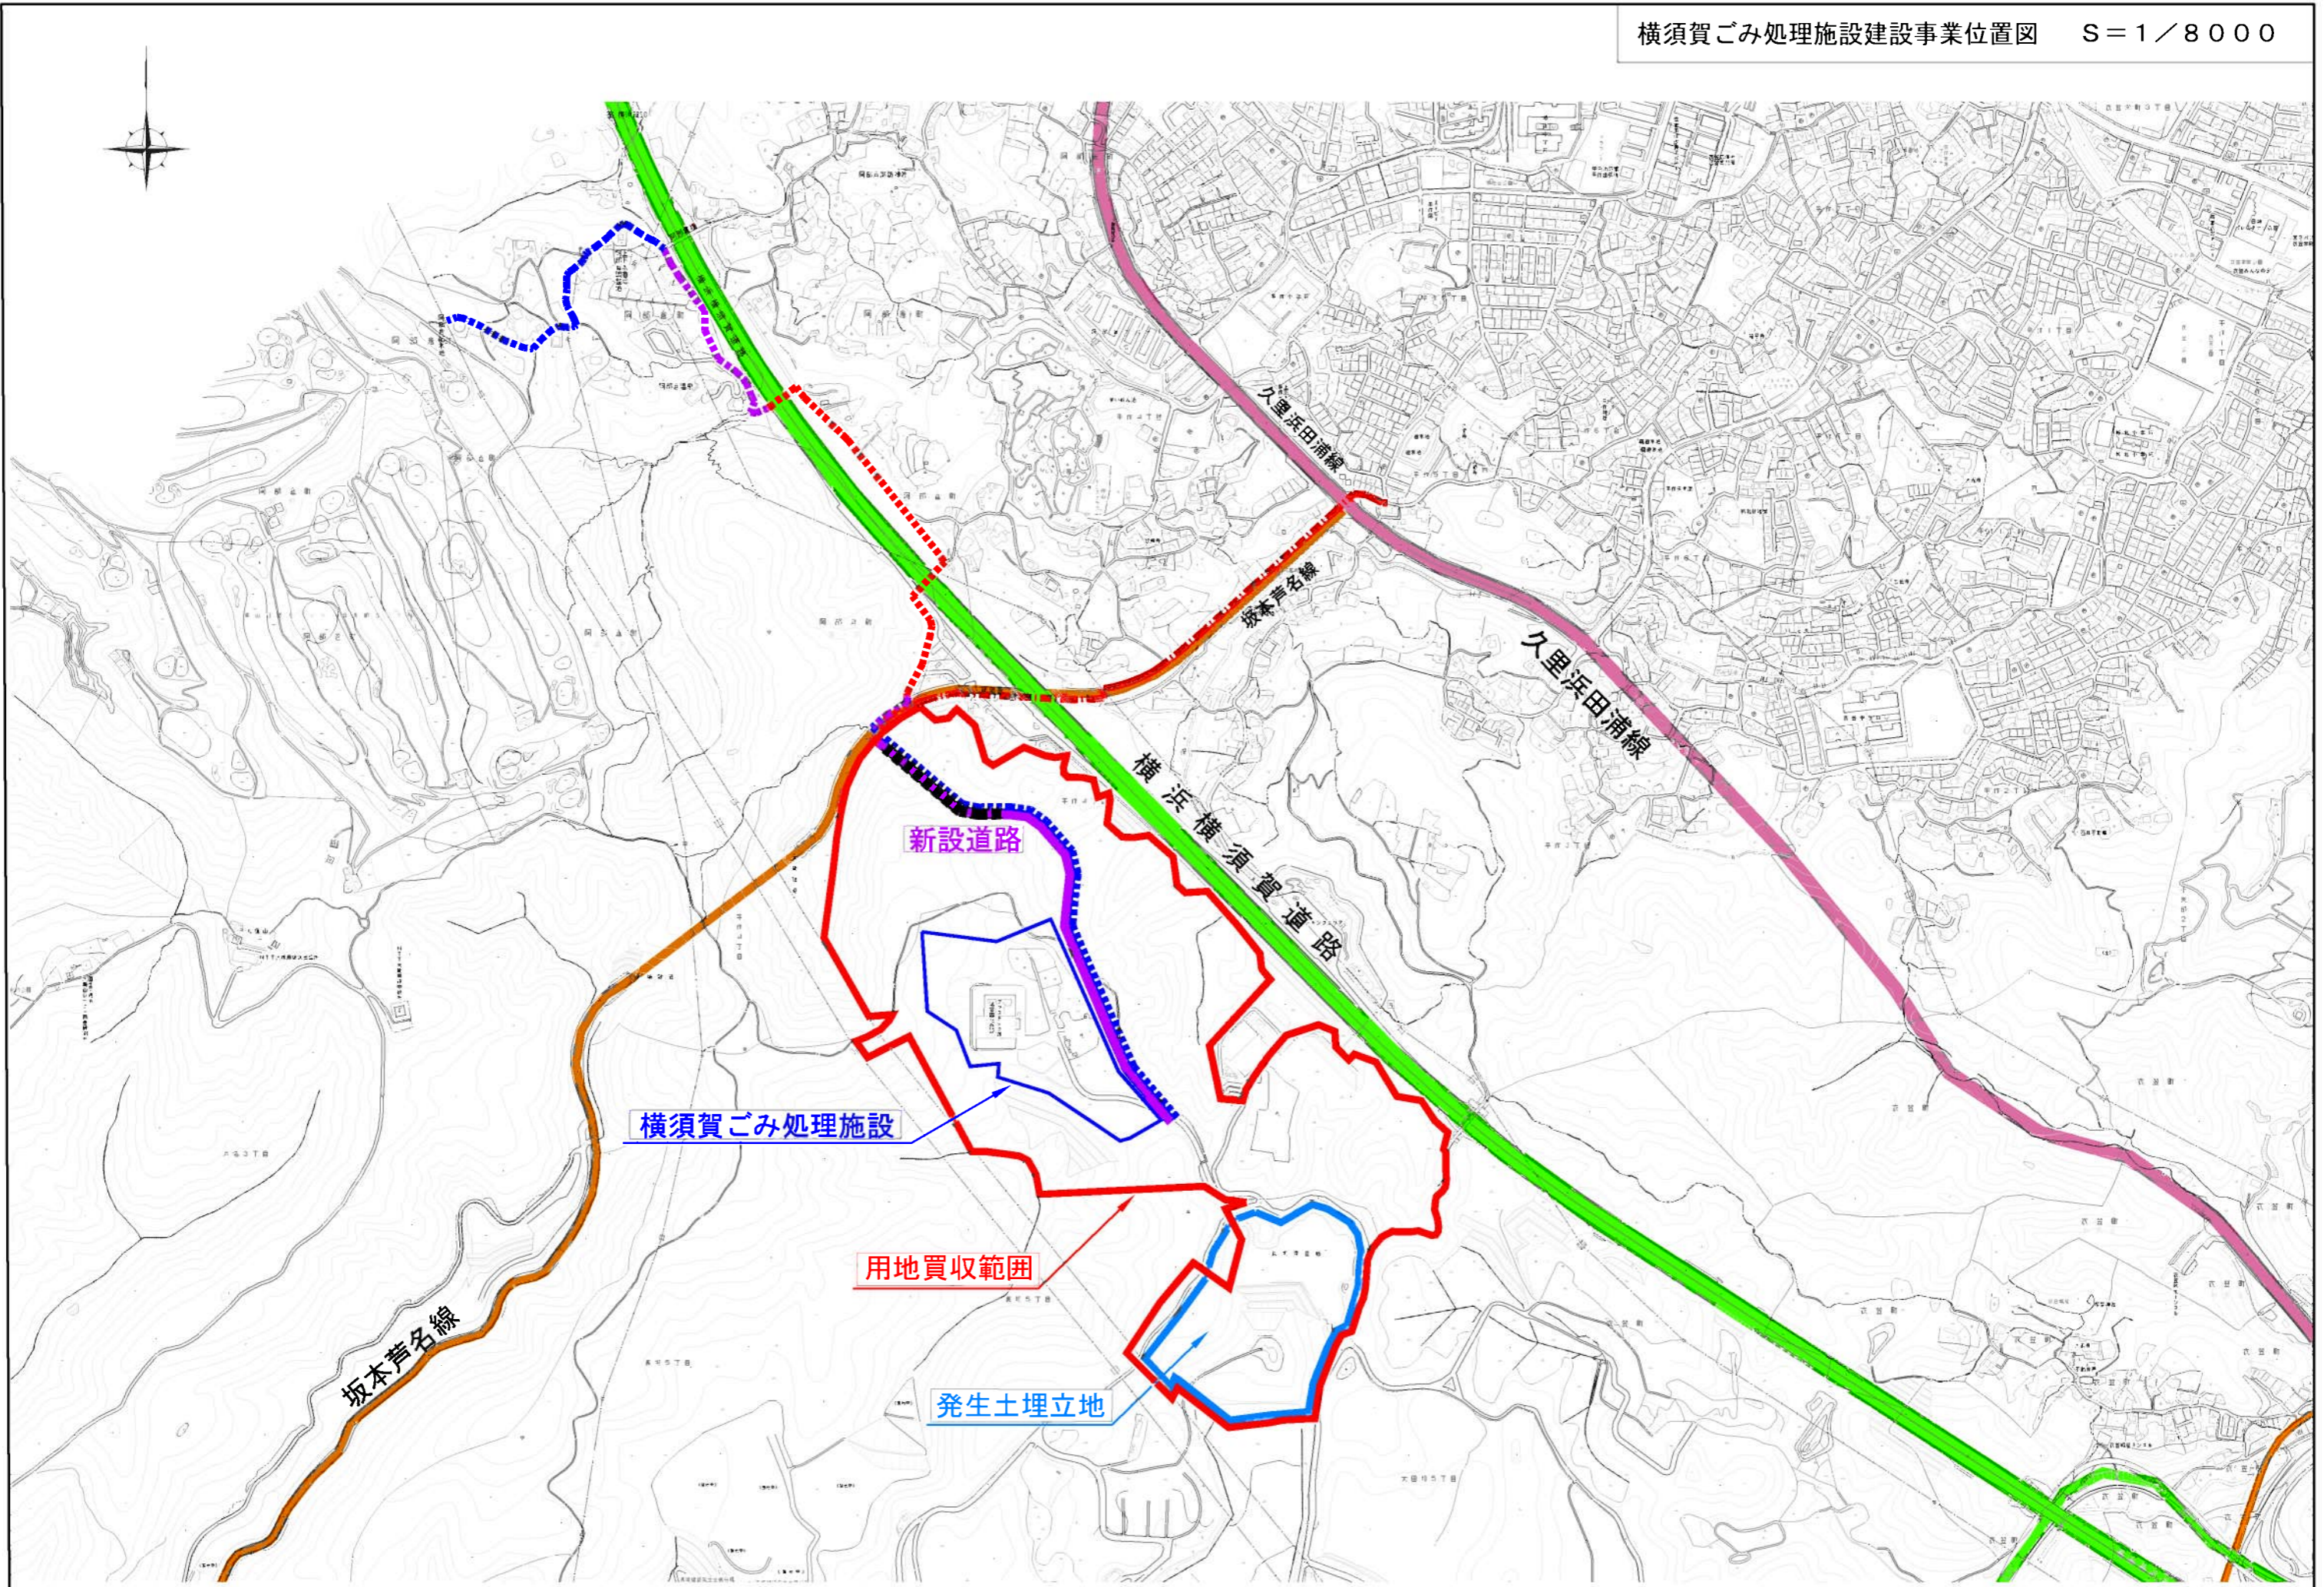

横須賀ごみ処理施設建設工事写真

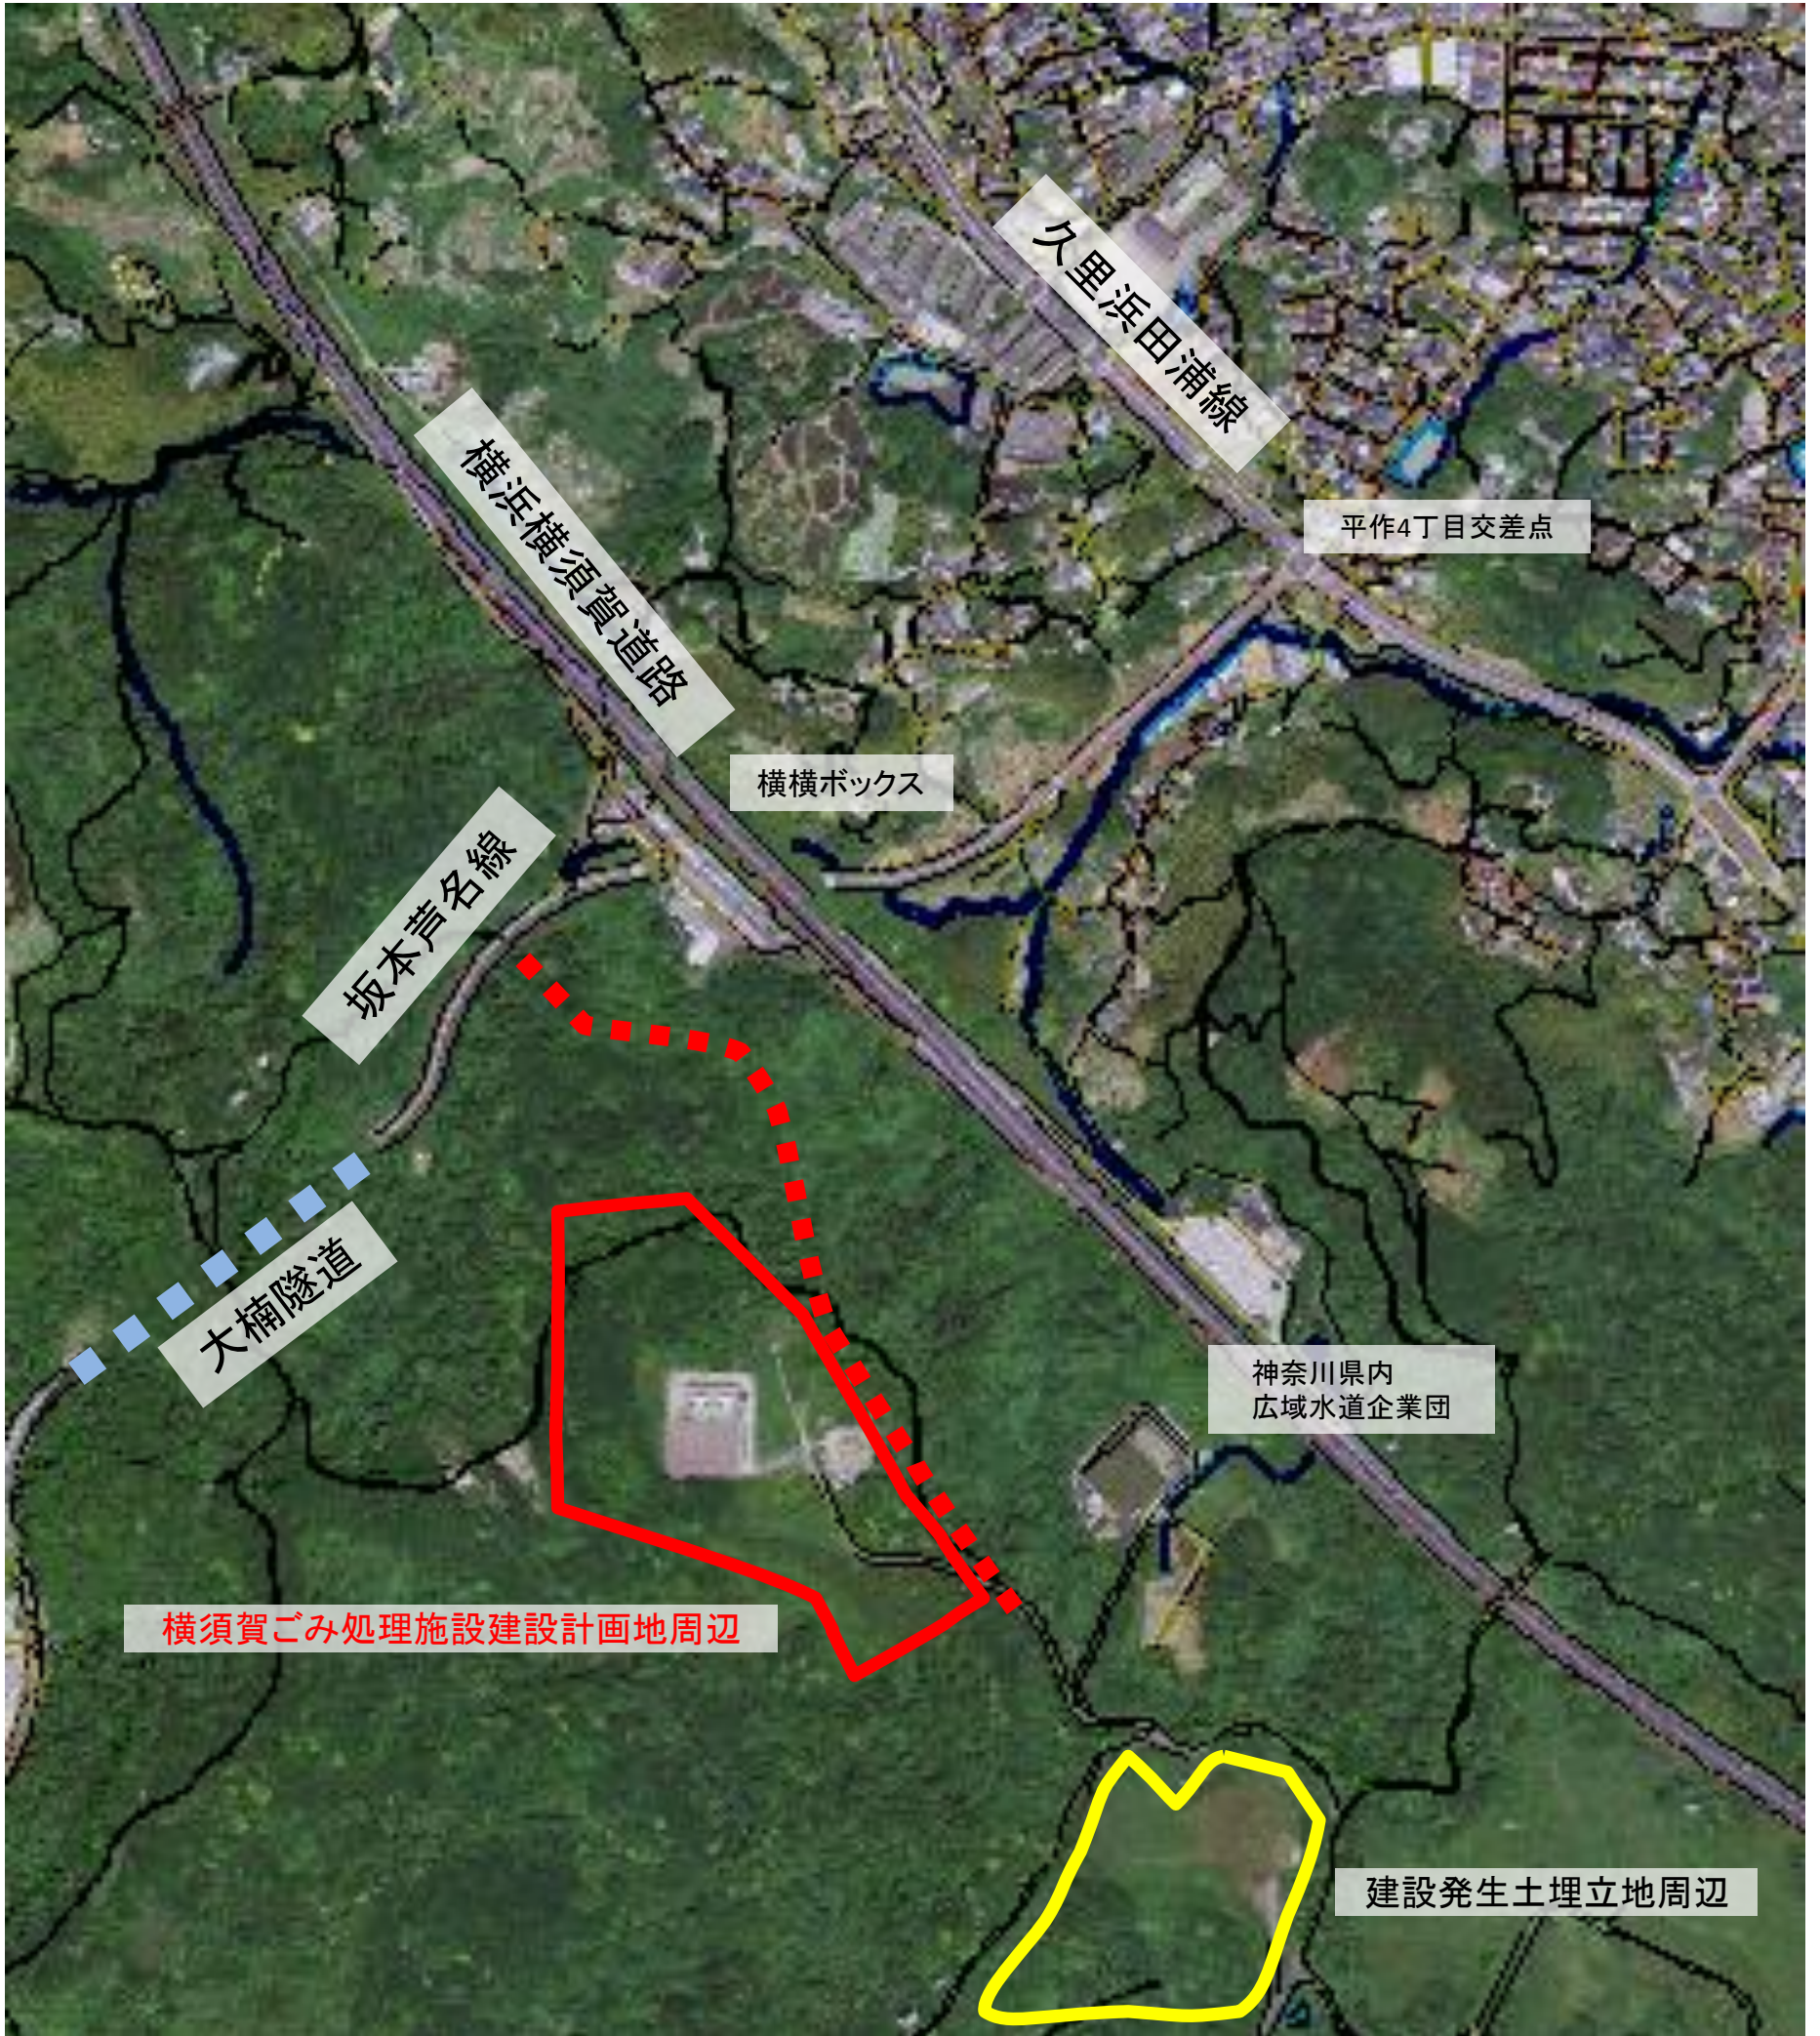

横須賀ごみ処理施設建設計画地周辺(施工前)



横須賀ごみ処理施設建設計画地周辺(施工中)



建設発生土埋立地周辺(施工前)



建設発生土埋立地周辺(施工中)

