

工事の様子(2024年3月22日)


病院本棟は地上躯体のコンクリート工事が完了します。

外装工事は外壁塗装を行えるように建具等の工事を各階に施工し、内装工事は部屋の間仕切り壁の下地等を施工しています。内装工事の進捗に合わせて設備工事を行なっています。

リニアック棟は基礎躯体工事を行なっています。


外構工事を3月11日から開始しています。

病院本棟 4階(病棟階) 施工状況

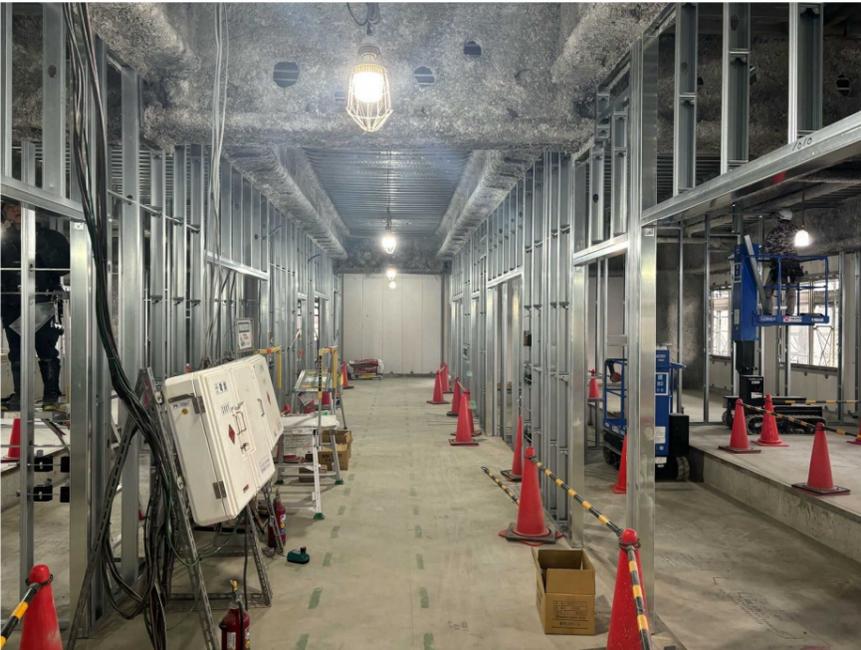

部屋を間仕切る壁の下地を施工しています。今後、壁のボード張りや天井下地を施工していきます。

病院本棟 1階 施工状況

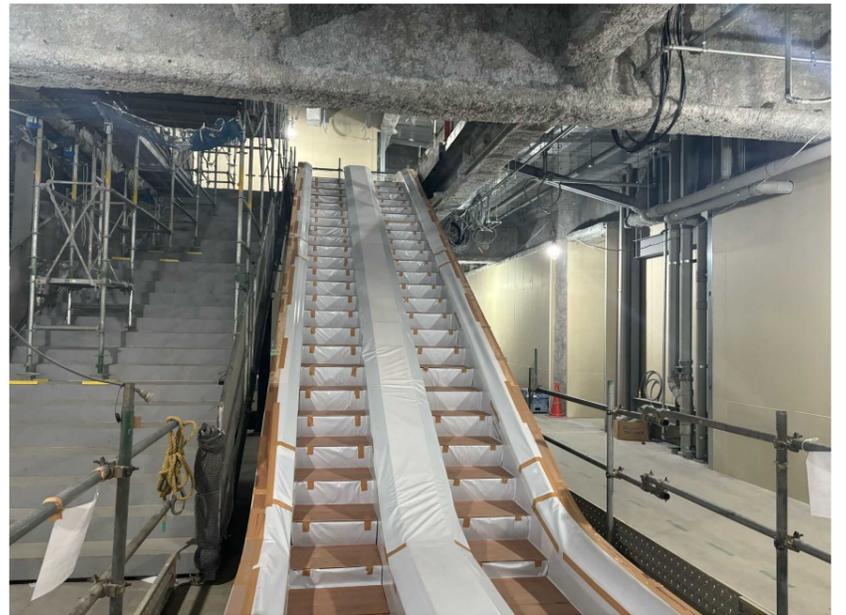

1階エントランスと2階外来受付を結ぶエスカレーターを設置しています。(白色のシートで養生しています。)今後、エレベーターも設置していきます。

※リニアック棟とは、がんの種類やステージに合わせて柔軟な治療が可能な高精度放射線治療を行う建物です。

リニアック棟 施工状況



基礎躯体の鉄筋工事を行なっています。今後、型枠工事をを行いコンクリートを打設します。
