

横須賀市公立保育園再編実施計画

— 令和7年度（2025年度）～令和11年度（2029年度） —

令和7年（2025年）3月

横 須 賀 市

【目 次】

1 計画策定の目的・計画期間.....	- 1 -
2 地域ごとの再編の進め方.....	- 2 -
（1）追浜・田浦行政センター区域（追浜保育園、船越保育園、田浦保育園）.....	- 2 -
（2）本庁・逸見行政センター区域（中央こども園）.....	- 2 -
（3）衣笠・西行政センター区域（森崎保育園、武山保育園）.....	- 3 -
（4）大津・浦賀行政センター区域（鴨居保育園）.....	- 4 -
（5）久里浜・北下浦行政センター区域（ハイランド保育園、津久井保育園）.....	- 4 -
3 再編のスケジュール.....	- 5 -
（1）認定こども園として再配置・建替えをする施設.....	- 5 -
（2）民営化を予定している施設.....	- 5 -
（3）必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続する施設.....	- 6 -

1 計画策定の目的・計画期間

本計画は、「公立保育園再編計画（令和２年度～令和１１年度）」の具体的なロードマップとして、令和７年度から令和１１年度（５年間）の実施計画を定めています。

前半の５年間（令和２年度から令和６年度）においては、逸見保育園の民営化、中央こども園の整備に加え、さまざまな保育園の再編方針を決定してきました。後半の５年間においては、これらの再編方針に沿って事業を着実に進めて行くことに加え、残りすべての公立保育園の再編方針を定めます。

計画の遂行にあたっては、市民及び関係者の皆様のご理解を得ながら、第３期横須賀こども未来プラン、横須賀再興プラン、横須賀市ＦＭ戦略プランなどとの整合を図っていきます。

2 地域ごとの再編の進め方

(1) 追浜・田浦行政センター区域（追浜保育園、船越保育園、田浦保育園）

①幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策

	令和7年度（2025年度）						令和11年度（2029年度）					
	1号	2号		3号			1号	2号		3号		
		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳
量の見込み ① (人)	343	85	398	109	100	34	313	91	365	67	60	24
確保方策 合計 ② (人)		459	444	147	125	68		444	405	143	122	64
過不足 ②-① (人)		31	46	38	25	34		40	40	76	62	40

②追浜保育園

現地建替えし、（仮称）北こども園として整備します。

③船越保育園

耐震安全性が確保されていない現園舎から近隣の船越6丁目第2公園内に整備する仮設園舎へ一時移転します。

その後、現園舎を解体、新園舎を建築後、民営化します（民設民営）。

④田浦保育園

田の浦公園内プール敷地の一部を転用して園舎を新築後、民営化します（民設民営）。

(2) 本庁・逸見行政センター区域（中央こども園）

①幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策

	令和7年度（2025年度）						令和11年度（2029年度）					
	1号	2号		3号			1号	2号		3号		
		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳
量の見込み ① (人)	445	108	451	128	117	52	341	99	397	69	59	30
確保方策 合計 ② (人)		751	411	124	105	73		691	430	146	134	86
過不足 ②-① (人)		198	△40	△4	△12	21		251	33	77	75	56

②中央こども園

必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続します。

(3) 衣笠・西行政センター区域（森崎保育園、武山保育園）

①幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策

	令和7年度(2025年度)						令和11年度(2029年度)					
	1号	2号		3号			1号	2号		3号		
		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳
量の見込み ① (人)	840	188	815	225	210	83	727	212	848	159	138	71
確保方策 合計 ② (人)		920	818	233	194	100		829	848	206	188	118
過不足 ②-① (人)		△108	3	8	△16	17		△110	0	47	50	47

②森崎保育園（ハイランド保育園と統合）

久里浜公園内プール敷地の一部を転用して園舎を新築後、（仮称）南こども園として整備します。

③武山保育園

現地建替えし、（仮称）西こども園として整備します。

<参考>大楠幼稚園の廃止と武山保育園の再編について

同区域内に所在する大楠幼稚園は、今後も園児数の減少が見込まれ、幼児教育の水準を維持していくことが困難であることを理由に、令和6年度末で廃園とすることが決まりました。

武山保育園は耐震診断の結果を受け、現地において建替えとする方針としましたが、待機児童の解消や大楠幼稚園の廃園等、衣笠・西行政センター区域の状況に合わせた幼児期の教育・保育機能を効率的に確保し、さらに集約を図るため、建替えに併せて認定こども園として再編します。

(4) 大津・浦賀行政センター区域（鴨居保育園）

①幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策

	令和7年度（2025年度）						令和11年度（2029年度）					
	1号	2号		3号			1号	2号		3号		
		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳
量の見込み ① (人)	639	138	608	161	168	56	521	152	607	120	110	47
確保方策 合計 ② (人)		804	629	172	138	64		759	629	183	142	66
過不足 ②-① (人)		27	21	11	△30	8		86	22	63	32	19

②鴨居保育園

必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続します。

(5) 久里浜・北下浦行政センター区域（ハイランド保育園、津久井保育園）

①幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策

	令和7年度（2025年度）						令和11年度（2029年度）					
	1号	2号		3号			1号	2号		3号		
		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳		教育 利用	保育 利用	2 歳	1 歳	0 歳
量の見込み ① (人)	808	196	640	215	199	88	667	194	777	204	168	69
確保方策 合計 ② (人)		1,437	740	265	207	95		1,353	702	249	193	89
過不足 ②-① (人)		433	100	50	8	7		492	△75	45	25	20

②ハイランド保育園（森崎保育園と統合）

久里浜公園内プール敷地の一部を転用して園舎を新築後、（仮称）南こども園として整備します。

③津久井保育園

必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続します。

3 再編のスケジュール

(1) 認定こども園として再配置・建替えをする施設

- ① (仮称) 南こども園 (令和8年度開園予定)
⇒久里浜公園内プール敷地の一部を転用して園舎を新築後、
森崎保育園・ハイランド保育園を再配置・建替え
- ② (仮称) 西こども園 (令和9年度新園舎供用開始予定、令和10年度園庭等整備工事、
令和11年度こども園開園予定)
⇒武山保育園を現地建替え
- ③ (仮称) 北こども園 (令和11年度新園舎供用開始予定、令和12年度園庭等整備工事、
令和13年度こども園開園予定)
⇒追浜保育園を現地建替え

	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)
(仮称) 南こども園	新築工事 園庭工事	開園予定			
(仮称) 西こども園	実施設計	新築工事 ㊟解体設計	新築工事 供用開始 ㊟解体工事	園庭等工事	開園予定
(仮称) 北こども園	基本設計 ㊟解体設計	実施設計 ㊟解体工事	新築工事	新築工事 ㊟解体設計	供用開始 ㊟解体工事

㊟：武山保育園園舎及び別棟園舎 ㊟：追浜保育園乳児棟 ㊟：追浜保育園幼児棟

(2) 民営化を予定している施設

- ① 田浦保育園 (令和8年度民営化予定)
⇒田の浦公園内プール敷地の一部を転用して園舎を新築後、民営化 (民設民営)
- ② 船越保育園 (令和7年度仮設園舎へ一時移転、令和9年度民営化予定)
⇒現地に園舎を新築後、民営化 (民設民営)

	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)
田浦保育園	新築工事	民営化予定			
船越保育園 (民営化)	実施設計 解体工事	新築工事 引継ぎ・ 共同保育	民営化予定		
船越保育園 (仮設)	整備工事 供用開始		解体工事予定		


(3) 必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続する施設

- ① 中央こども園
- ② 鴨居保育園
- ③ 津久井保育園


	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)
中央こども園	必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続				
鴨居保育園					
津久井保育園					

図表 1 再編のイメージ（令和 7 年度から令和 11 年度の 5 年間）


◆認定こども園として再配置・建替えをする施設

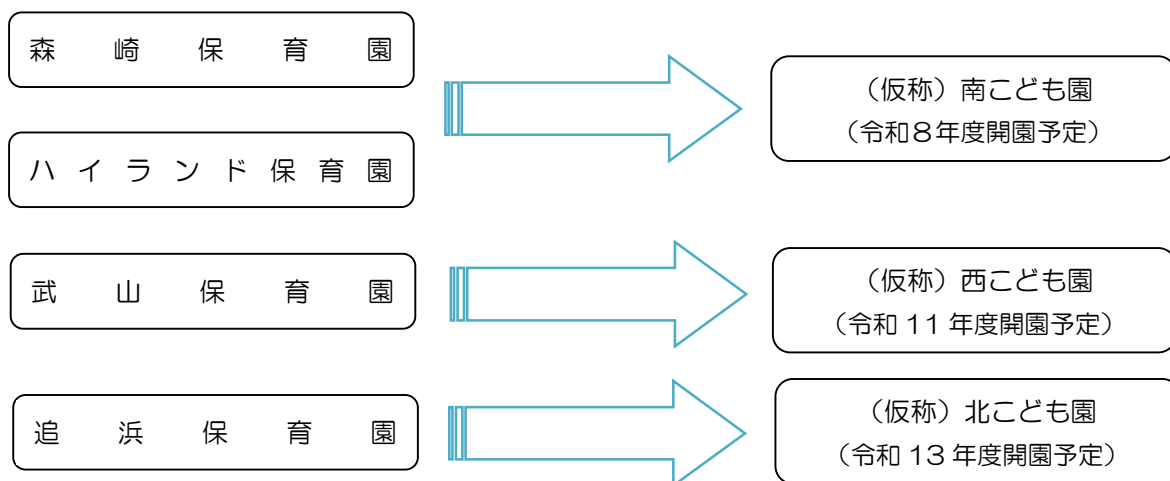

◆民営化を予定している施設

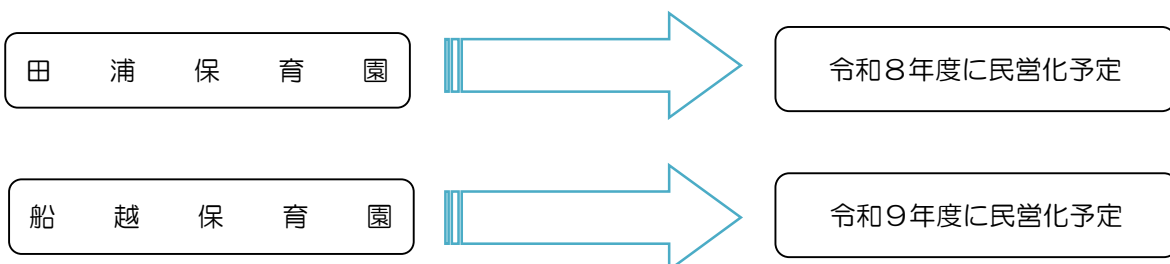

◆必要に応じて修繕しながら、当面の間は現状の運営を継続する施設

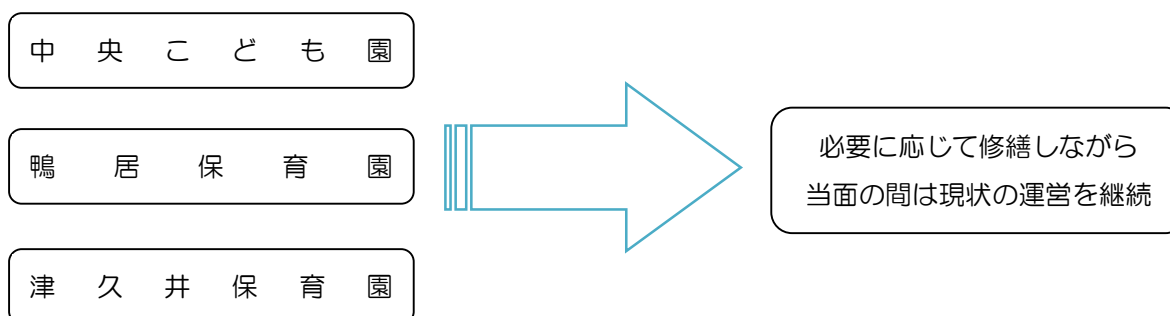

(参考) 図表 2 公立保育園等の所在地等

保 育 園 名 (所 在 地)		開設 年度	定員 (人)	建 築 物					敷地面積 (㎡)
				区分	床面積 (㎡)	竣工 年月	築年数	構造・規模	
1	追浜保育園 (追浜本町 2-1)	S25	152	乳児棟	200.00	S41.2	59	補強 コンクリートブロック造	1,974.70
				幼児棟	583.47	S52.3	48	軽量鉄骨造	
				休憩室	13.69	H4.3	33	軽量鉄骨造	
				計	797.16				
2	船越保育園 (船越町 6-69)	S23	100	園 舎	480.27	S54.3	46	軽量鉄骨造	1,206.47
3	田浦保育園 (長浦町 1-1597)	S28	90	園 舎	539.54	S53.3	47	鉄筋コンクリート造 2階建	1,477.67
4	中央こども園 (小川町 20)	R4	150	園 舎	1,335.17 (2,970.25)	R4.2	3 (43)	鉄筋コンクリート造 6階建のうち 1～3階	(1,297.33)
5	森崎保育園 (森崎 3-8-1)	S49	100	園 舎	461.22	S49.3	51	軽量鉄骨造	1,824.53
6	鴨居保育園 (鴨居 3-1-6)	R2	120	園 舎	841.85	R3.2	4	軽量鉄骨造	4783.98
7	ハイランド保育園 (ハイランド 2-12-17)	S55	100	園 舎	537.95	S55.9	44	鉄筋コンクリート造 2階建	1,818.24
8	津久井保育園 (津久井 2-14-22)	S51	100	園 舎	537.40	S51.3	49	鉄筋コンクリート造 2階建	950.00
9	武山保育園 (武 4-17-1)	S44	100	園 舎	307.44	S44.3	56	補強 コンクリートブロック造	2,037.44
				別棟園舎	205.24	S56.3	44	軽量鉄骨造	
				計	512.68				

※築年数は、令和7年3月31日現在

※中央こども園は、リノベーションにより開所した子育て支援拠点施設「すくすくかん（6階建）」の一部。

() 内の数値は、すくすくかんのもの。



横須賀市公立保育園再編実施計画

— 令和7年度（2025年度）～令和11年度（2029年度） —

令和7年（2025年）3月

（お問い合わせ先）

横須賀市民生局福祉こども部子育て支援課

電 話：046-822-9002

FAX：046-827-0652

E-mail：cw-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp
