

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月24日

計画の名称	横須賀市みどりの保全及び創出事業（第2期）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	横須賀市												
計画の目標	<p>本市では、近代～現代の急激な人口増加に伴う都市化と生活様式の変化によって、みどりが減少し、自然環境の荒廃が進みました。人を含む多様な生物が生息・生育・繁殖していくことができる豊かな自然環境を守り、つくり、再生し、育てながら活かすことの重要性が高まり、さらに人々が快適で豊かに生活していける都市づくりが求められています。</p> <p>本整備計画では「横須賀市みどりの基本計画」の基本理念である「みどりに親しめるまち横須賀」を踏まえ、首都圏近郊緑地特別保全地区等のまとまりのあるみどりの保全や、バリアフリー化など都市公園の安全・安心対策に係る事業等を推進し、誰もが利用しやすい活気あふれた公園づくりと、骨格となる丘陵部のみどりの保全をめざします。そして、緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進に向け、地域に応じた都市公園の配置と機能の再編等を戦略的に進めるため、横須賀市みどりの基本計画を改定します。また、令和3年に開催される『全国「みどりの愛護」のつどい』を、中央公園で開催すべく、神奈川県と連携して誘致を進めており、三浦半島地域の「みどり」と「うみ」の豊かな自然の魅力や歴史文化を全国に直接発信できる機会になるとともに、観光資源を生かしたにぎわいの創出や、地域の活性化に資する公園再整備を進めます。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,521	A	1,519	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.13	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R02末
1	都市公園における便所等のバリアフリー化を行う。【37.8%（H27末） 48.9%（R02末）】 都市公園における便所、園路・出入口のバリアフリー化が完了した公園数を把握し、達成率を計測する。 （便所、園路・出入口がバリアフリー化された適合公園数） / 対象施設が設置されている公園数 × 100（例外規定公園は除く）	38%	44%	49%
2	横須賀市公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化対策（劣化施設の撤去・更新）を推進する。【0施設（H27末） 50施設（R02末）】 横須賀市公園施設長寿命化計画に基づき長寿命化対策（劣化施設の撤去・更新）を実施した施設数を集計する。 対象施設：遊技施設等	0施設	30施設	50施設
3	首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入を実施する。【48.6%（H27末） 60.9%（R02末）】 首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入面積を集計する。 買入面積 ÷ 首都圏近郊緑地特別保全地区面積 × 100（2地区：244ha）	49%	56%	61%
4	主な集客公園について公園施設の長寿命化計画を策定する。【0公園（H29末） 6公園（R02末）】 主な集客公園を長寿命化計画に位置付け、計画策定した公園数を集計する。	0公園	6公園	6公園

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市都市公園安全・安心対策事業(1-A-1)	安全安心対策(バリアフリー化等10公園)	横須賀市						200		策定済	
	A12-002	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市都市公園安全・安心対策事業(1-A-2)	長寿命化対策(遊戯・運動施設の更新等)	横須賀市						252		策定済	
	A12-003	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市緑地保全等事業(1-A-3)	土地の買入等(2地区,30ha)	横須賀市						800		策定済	
	A12-004	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市公園施設長寿命化計画策定調査(1-A-4)	計画策定 6箇所	横須賀市						30		策定済	
	A12-005	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市公園事業特定計画調査	横須賀市みどりの基本計画改定	横須賀市						14		-	
	A12-006	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市都市公園事業(国家的事業関連公園)	中央公園再整備(4ha)	横須賀市						223		策定済	
												小計						1,519		

C 効果促進事業


基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況				
												H28	H29	H30	H31	R02							
一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																							
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	-	-	横須賀市都市公園事業(国家的事業関連公園)に伴う公園エントランス隣接部改修事業	中央公園エントランス隣接部改修	横須賀市							2		-			
		横須賀を象徴する公園と歴史や文化などを発信する文化会館、自然史博物館との拠点間連携のさらなる強化が期待される。																					
													小計						2				
													合計							2			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 策定主体にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年11月
	公表の方法 横須賀市ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化対策による誰もが利用しやすい活気あふれた公園づくりや、首都圏近郊緑地特別保全地区等に入入による骨格となる丘陵部のみどりの保全により、地域の活性化や豊かな自然の保全に寄与された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	旧日本軍の演習砲台跡を利用して造られた「中央公園」は開設50年を迎え、公園全体が老朽化していたことに加え、『第32回全国「みどりの愛護」のつどい』の会場と「平和・文化・歴史」をコンセプトとした公園リニューアルに伴い、芝生広場、駐車場及びトイレ等の整備を行ったことで「歴史文化の保存となり、自然の魅力を活かした賑わいの創出や、みどり豊かな憩いの空間として、横須賀の街並みや東京湾を一望できる景観の創出」に寄与した。また、令和3年度11月に、『第32回全国「みどりの愛護」のつどい』による植樹式を行った。
特記事項（今後の方針等）	
「長寿命化対策の推進」「首都圏近郊緑地特別保全地区の土地の買入」については、引き続き継続的に事業を進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	バリアフリー化達成率		
	最終目標値	49%	計画の見直しを行い、長寿命化対策を優先したことにより、単年度あたりのバリアフリー化施設数を削減したため。
最終実績値	44%		
2	長寿命化対策施設数		
	最終目標値	50施設	当初想定より多く施設の更新を実施したため、最終目標値の50施設を上回った。
最終実績値	53施設		
3	土地の買入面積		
	最終目標値	61%	買入金額が当初の想定から変動したため。
最終実績値	59%		
4	計画策定公園数		
	最終目標値	6公園	
最終実績値	6公園		

(参考図面) 横須賀市みどりの保全及び創出事業 (第2期)

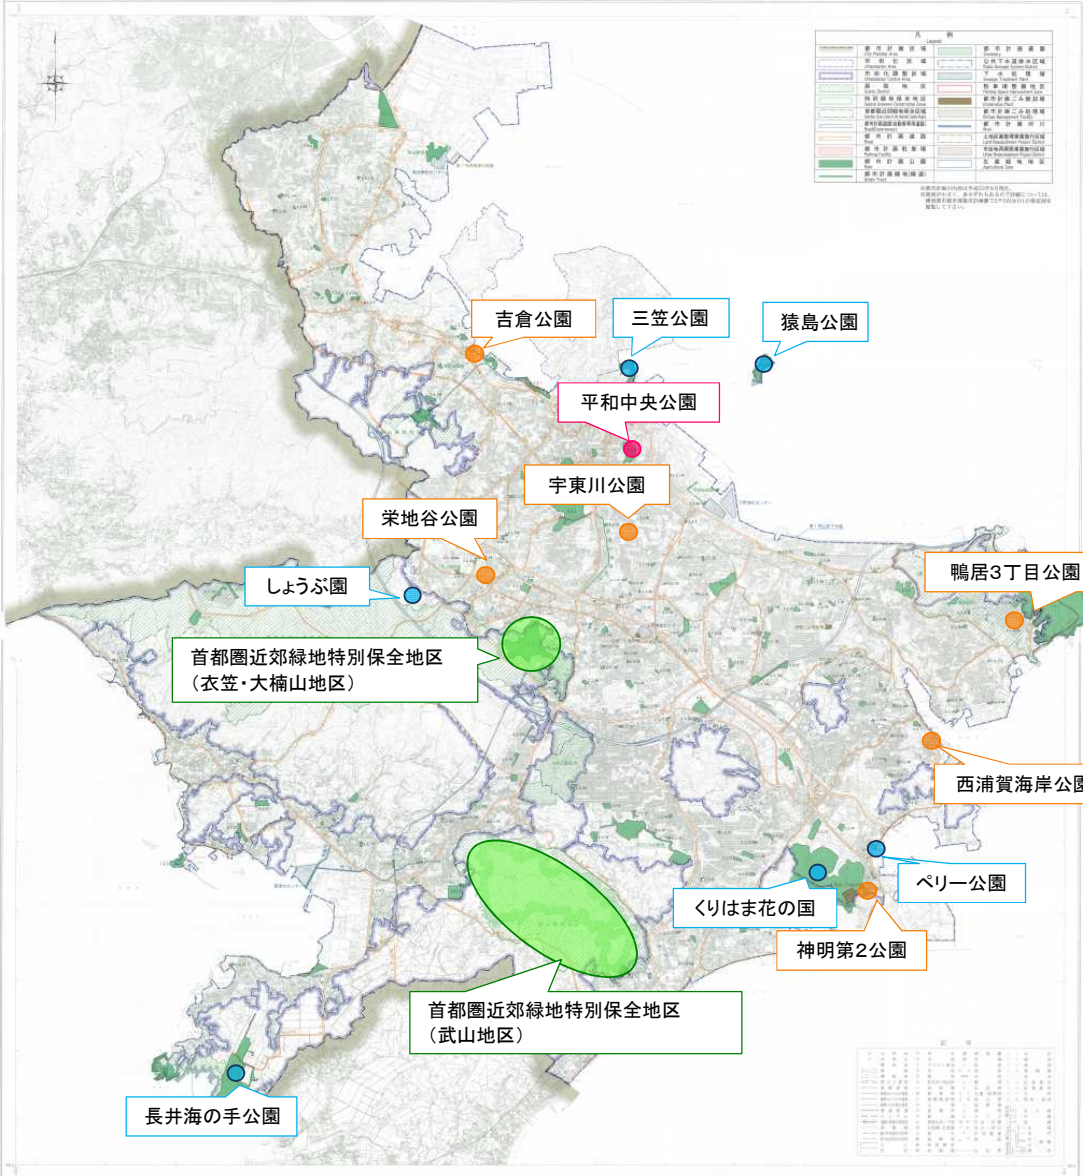計画の名称	1 横須賀市みどりの保全及び創出事業 (第2期)		交付対象	横須賀市								
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)											
<p>横須賀都市計画図 (都市施設) City Planning Map of Yokosuka (Municipal Facilities)</p> 							<p>番号</p>	<p>事業名</p>	<p>箇所数等</p>	<p>凡例</p>		
1-A-1	<p>横須賀市都市公園 安全・安心対策緊急総合支援事業 ・公園施設のバリアフリー化</p>	7公園	●									
1-A-2	<p>横須賀市公園施設 長寿命化計画策定支援事業 ・老朽化遊具の更新</p>		別紙									
1-A-3	<p>横須賀市緑地保全等事業 ・緑地の買入</p>	2地区	●									
1-A-4	<p>横須賀市公園事業特定計画調査 ・公園施設長寿命化計画策定</p>	6公園	●									
1-A-5	<p>横須賀市公園事業特定計画調査 ・みどりの基本計画の改定</p>	-										
1-A-6	<p>横須賀市都市公園事業 (国家的事業関連公園) ・中央公園再整備</p>	1公園	●									

(参考図面) 横須賀市みどりの保全及び創出事業 (第2期)

計画の名称	1 横須賀市みどりの保全及び創出事業 (第2期)		交付対象	横須賀市		
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)					
横須賀都市計画図 (都市施設) City Planning Map of Yokosuka (Municipal Facilities)						
番号	事業名	箇所数等	凡例			
1-A-2	横須賀市公園施設 長寿命化計画策定支援事業 ・老朽化遊具の更新	29公園 53施設	●			

「横須賀市みどりの保全及び創出事業(第2期)」による取り組み(平成28年度から令和2年度)

横須賀市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業


- 公園施設(トイレ、水飲み、園路、出入口)のバリアフリー化



吉倉公園



鴨居3丁目公園

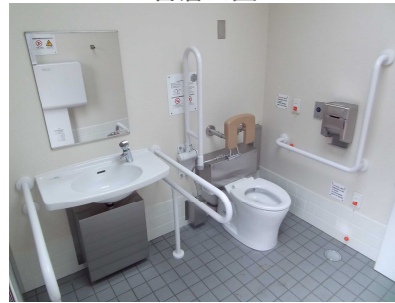

神明第2公園



西浦賀海岸公園




宇東川公園



栄地谷公園

横須賀都市計画図(都市施設)
City Planning Map of Yokosuka (Municipal Facilities)

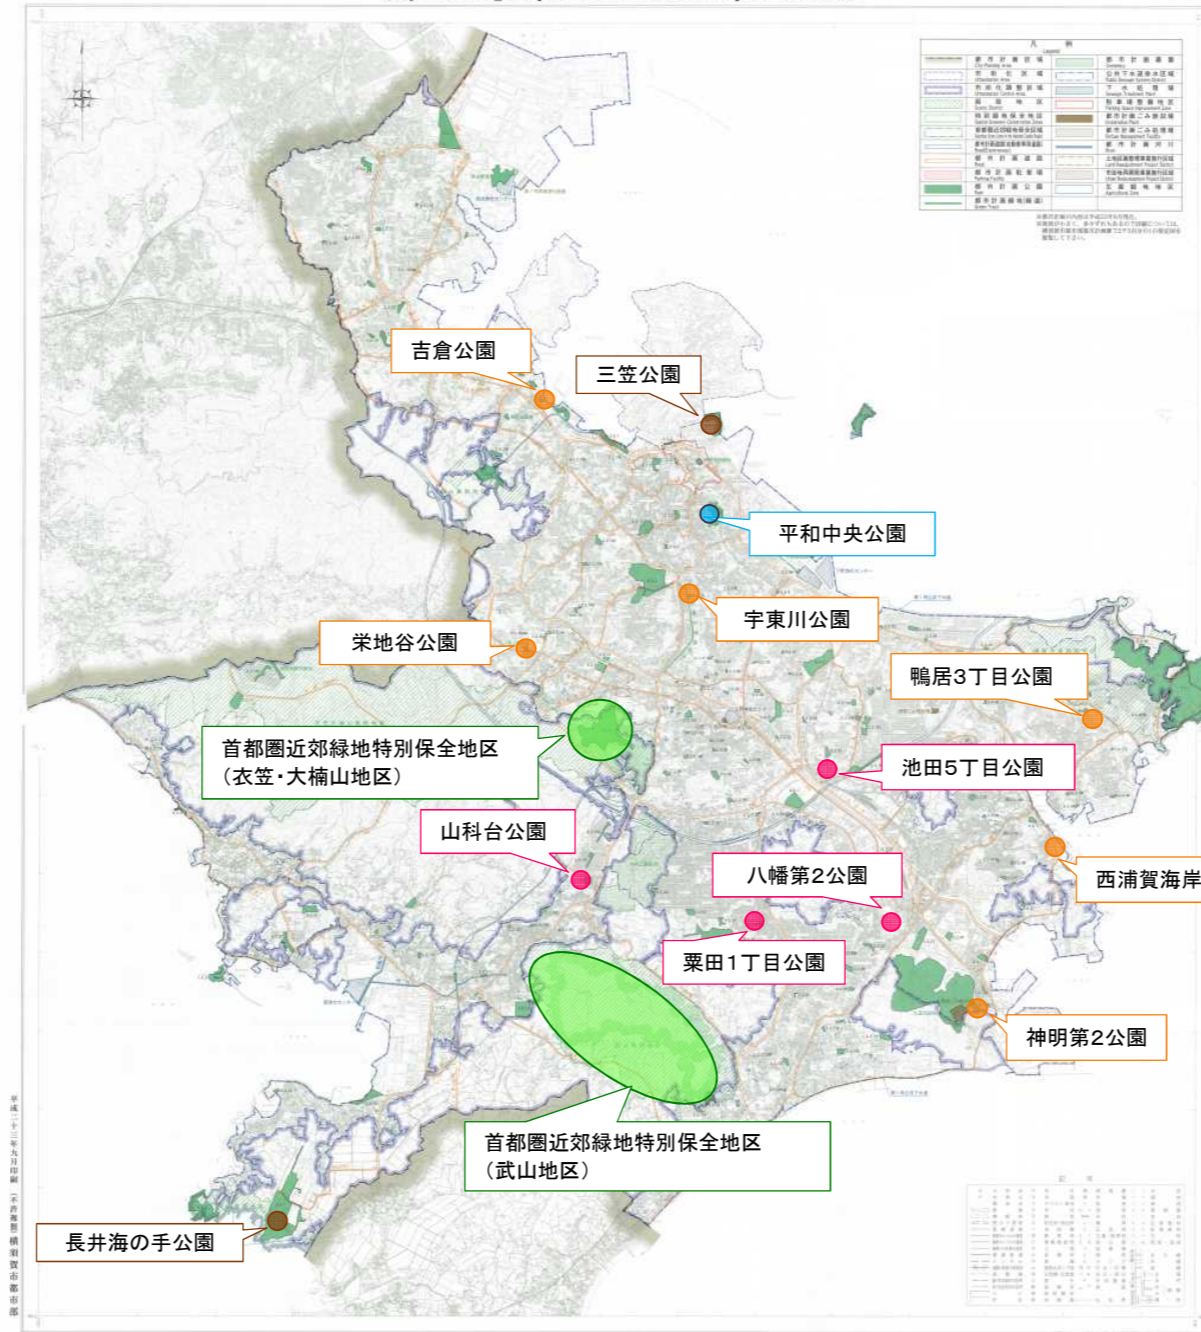

横須賀市都市公園事業(国家的事業関連公園)

- 令和3年9月開催予定の『全国「みどりの愛護」のつどい』の誘致
- 観光資源を生かした賑わいの創出、地域活性化に資する公園の再整備



平和中央公園

横須賀市長寿命化計画策定調査

- 集客公園の長寿命化計画策定



長井海の手公園



三笠公園

横須賀市公園事業特定計画調査

- みどりの基本計画の改定、都市公園の整備・管理の方針の検討

横須賀市緑地保全等事業

- 良好な自然環境(丘陵のみどり)の保全



衣笠・大楠山近郊緑地特別保全地区



武山近郊緑地特別保全地区

横須賀市公園施設長寿命化対策支援事業

- 老朽化した遊具の撤去、更新



栗田1丁目公園



八幡第2公園



池田5丁目公園



山科台公園

4公園以外は別紙参照
